


令和3年度 沖永区資源保全隊 活動写真

令和3年 4月	4/1	役員会議①
	4/11	総会書面議決 役員会議② 農林課と打合せ 農道路肩、水路法面、付帯施設等の草払い、側溝・水路泥上げ、不要物撤去(1回目)、除草剤散布 上力水門ストックマネジメント完了立会い
	4/12	
	4/21	
5月	①5/6	
	②5/7	
	5/16	役員会議③
6月	③6/8	揚水ポンプ及び配管の稼働前点検
7月	④7/18	農道路肩、水路法面、付帯施設等の草払い(2回目)
	⑤7/25	沖永・永田天神祇園祭(浮立)
8月	⑥8/23	大洪水後の見回り
9月		



令和3年度 沖永区資源保全隊 活動写真

令和3年 10月	⑦10/10	農道路肩、水路法面、付帯施設等の除草剤散布(3回目)
	10/23	役員会議④
11月	⑧11/9	畦畔の再構築(1,830m)
	⑨11/30	神待祭
12月	⑩12/5	美化運動(空き缶・ゴミ拾い等)
	12/7	役員会議⑤
	⑪12/18	老人会花植
令和4年 1月	⑫1/14	六田水路除草作業
	⑬1/14	公民館南側市道路肩整地
2月	⑭1/17	六田水路法面補修(共同)①
	⑮1/18	六田水路法面補修(共同)②
	⑯1/19	六田水路法面補修(共同)③
	⑰1/20	六田水路法面補修(共同)④
	⑱2/1	公民館南側市道路肩コンクリート補修(市からコンクリート支給を受け住民施工)
	⑲2/8	現地確認(農林課)
3月	⑳3/6	2号ポンプ場・樋道ポンプ場泥上げ
	㉑3/7	水路のゴミ除去
	㉒3/7	長寿命化工事に係る除草作業(一部直営施工)
	㉒3/7	長寿命化工事
	~3/10	排泥弁交換(5箇所)、埋設管補修(1箇所)
	㉓3/11	六田水路土砂流出箇所補修
	㉔3/21	点検・機能診断

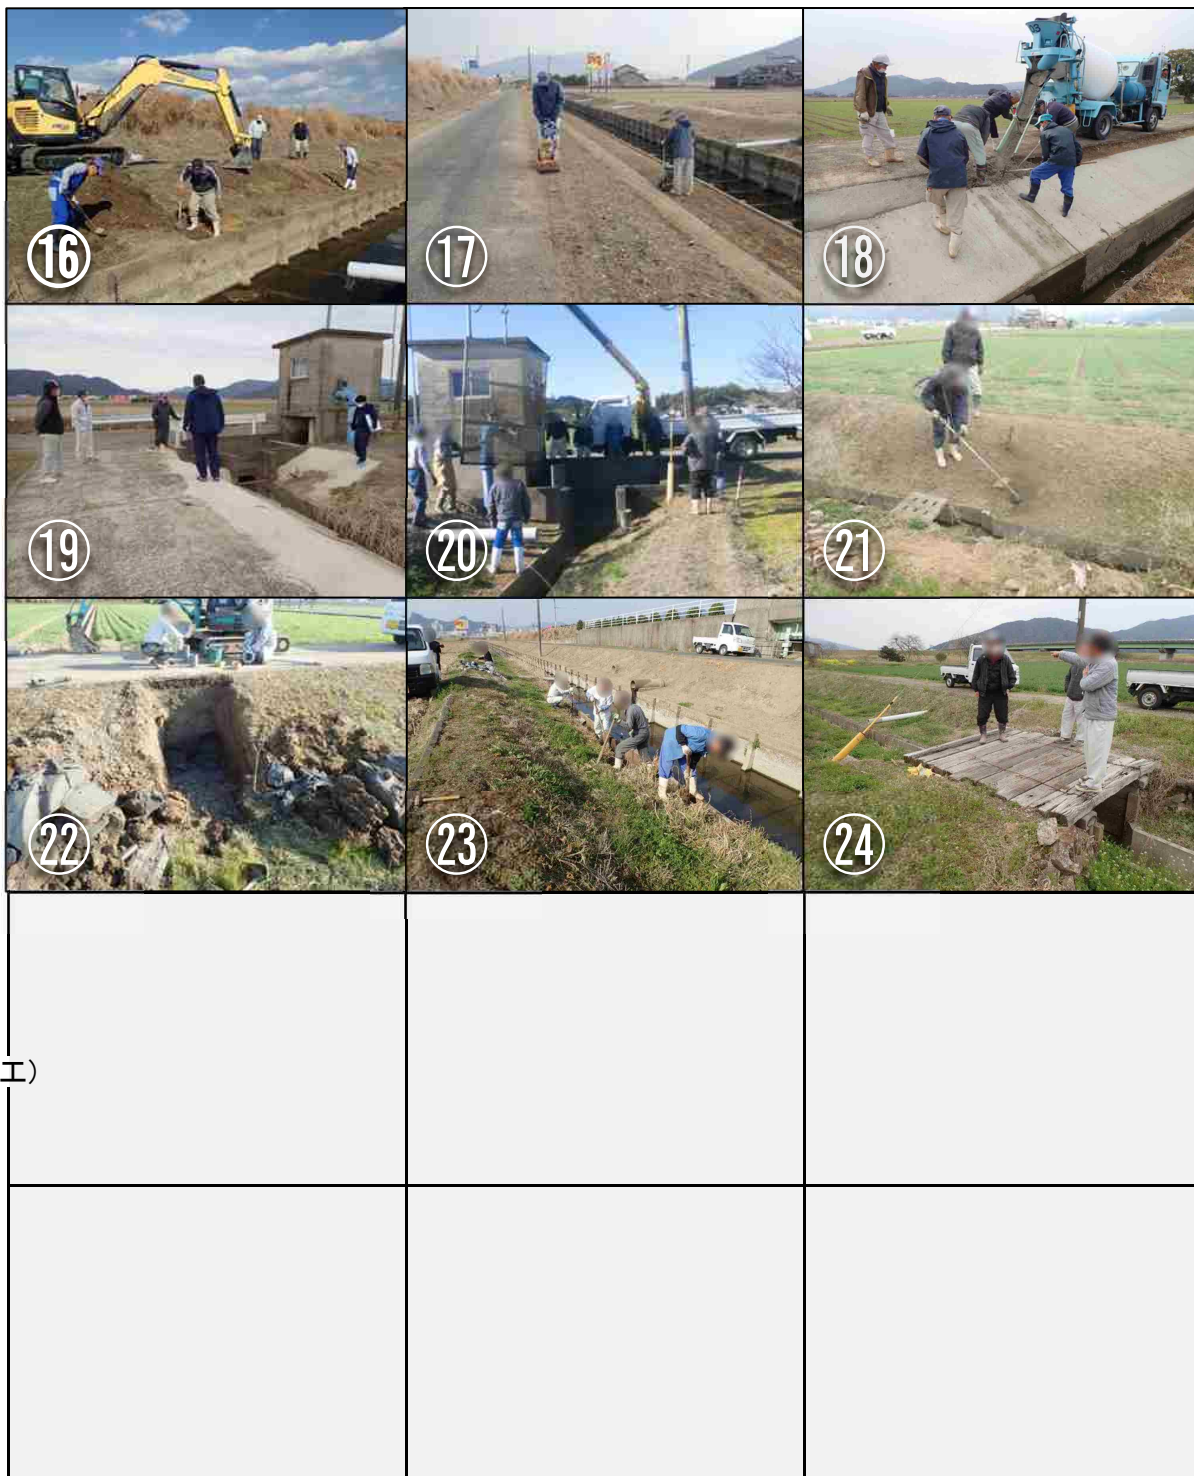

維持・共同

六田水路農道側法面補修

※度重なる豪雨、水害等で擁壁の崩落・土砂流出等、法面の痛みが酷いため、緊急的に補修を行った

補修前

2021/12/13

補修後

2022/1/17



下流側



上流側



土砂流出及び擁壁崩落箇所

六田水路農道側法面補修状況




長寿命化

排泥弁交換(5カ所) および埋設管破損箇所補修

2022/3/7

2022/3/11

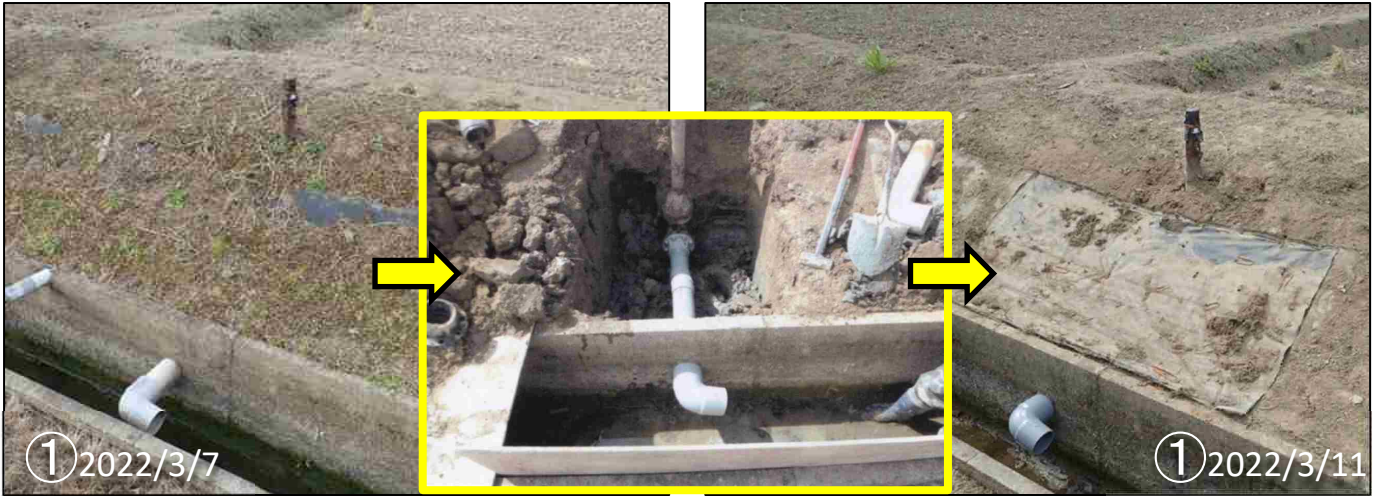

No.1 補修前

No.1 補修後



No.2 交換前

No.2 交換後



No.3 交換前

No.3 交換後

長寿命化

排泥弁交換(5カ所) および埋設管破損箇所補修

2022/3/7

2022/3/11



No.4 交換前

No.4 交換後



No.5 交換前

No.5 交換後



No.6 交換前

No.6 交換後

公民館南側水路(市道部分)路肩補修

(1/2)

※武雄市からの原材料(コンクリート)支給により、住民による市道路肩部分の補修が完了

黄枠が長寿命化分。赤枠が今回の路肩補修分



① 2021/1/20

長寿命化前(東から西方向)



② 2021/1/20

長寿命化前(西から東方向)



① 2021/2/4

路肩部分除いて長寿命化完了



② 2021/2/4

路肩部分除いて長寿命化完了



① 2022/2/1

路肩部分コンクリート補修完了



② 2022/2/1

路肩部分コンクリート補修完了

※赤枠内の作業詳細は次ページにあります

公民館南側水路(市道部分)路肩補修

(2/2)

※武雄市からの原材料(コンクリート)支給により、住民による市道路肩部分の補修が完了

補修作業の様子



コンクリート補修前の路肩部分整地①



コンクリート補修前の路肩部分整地②



コンクリート補修①



コンクリート補修②



コンクリート補修③




コンクリート補修④

ストックマネジメント完了立ち会い 上カ水門補修

工事前

工事後

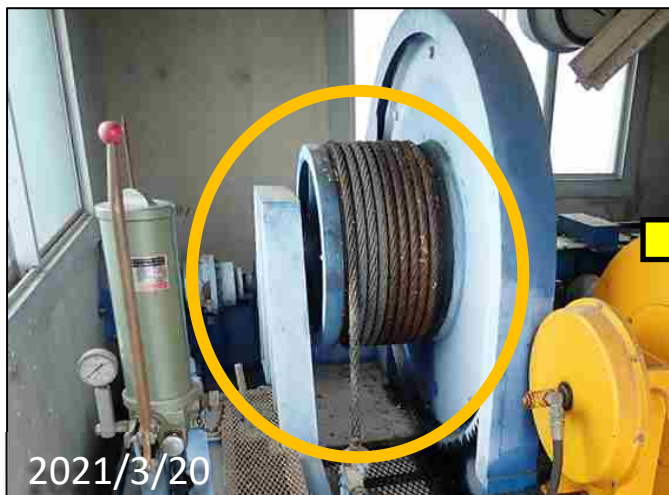

【親ゲート】

- ・ワイヤーロープの取り替え
- ・オイル、グリスの取り替え



【子ゲート】

- ・作動油の交換



【子ゲート】

- ・動作不良機器の撤去、油圧配管の取り替え
